


# 鉄道施設整備の進捗について

- IC化 : 完了 (2026/3/14 使用開始)
- 新型車両 : 設計中
- ホームかさ上げ : 3面/22面 完了 ( ■ : 完了 ■ : 今後施工 ■ : 対象外)
- レール交換 : 約 3.4km/約27km 完了 (2026/1末時点)
- 枕木交換 : 約 1,700本/約11,000本 完了 (2026/1末時点)
- 構内改良 : 設計中 (戸出駅・福光駅 分岐器高速化、城端駅 ホーム4両化 ほか)
- 仕業検査庫増築 : 設計中 (高岡駅)
- 連動改修 : 設計中 (施工は移管後)

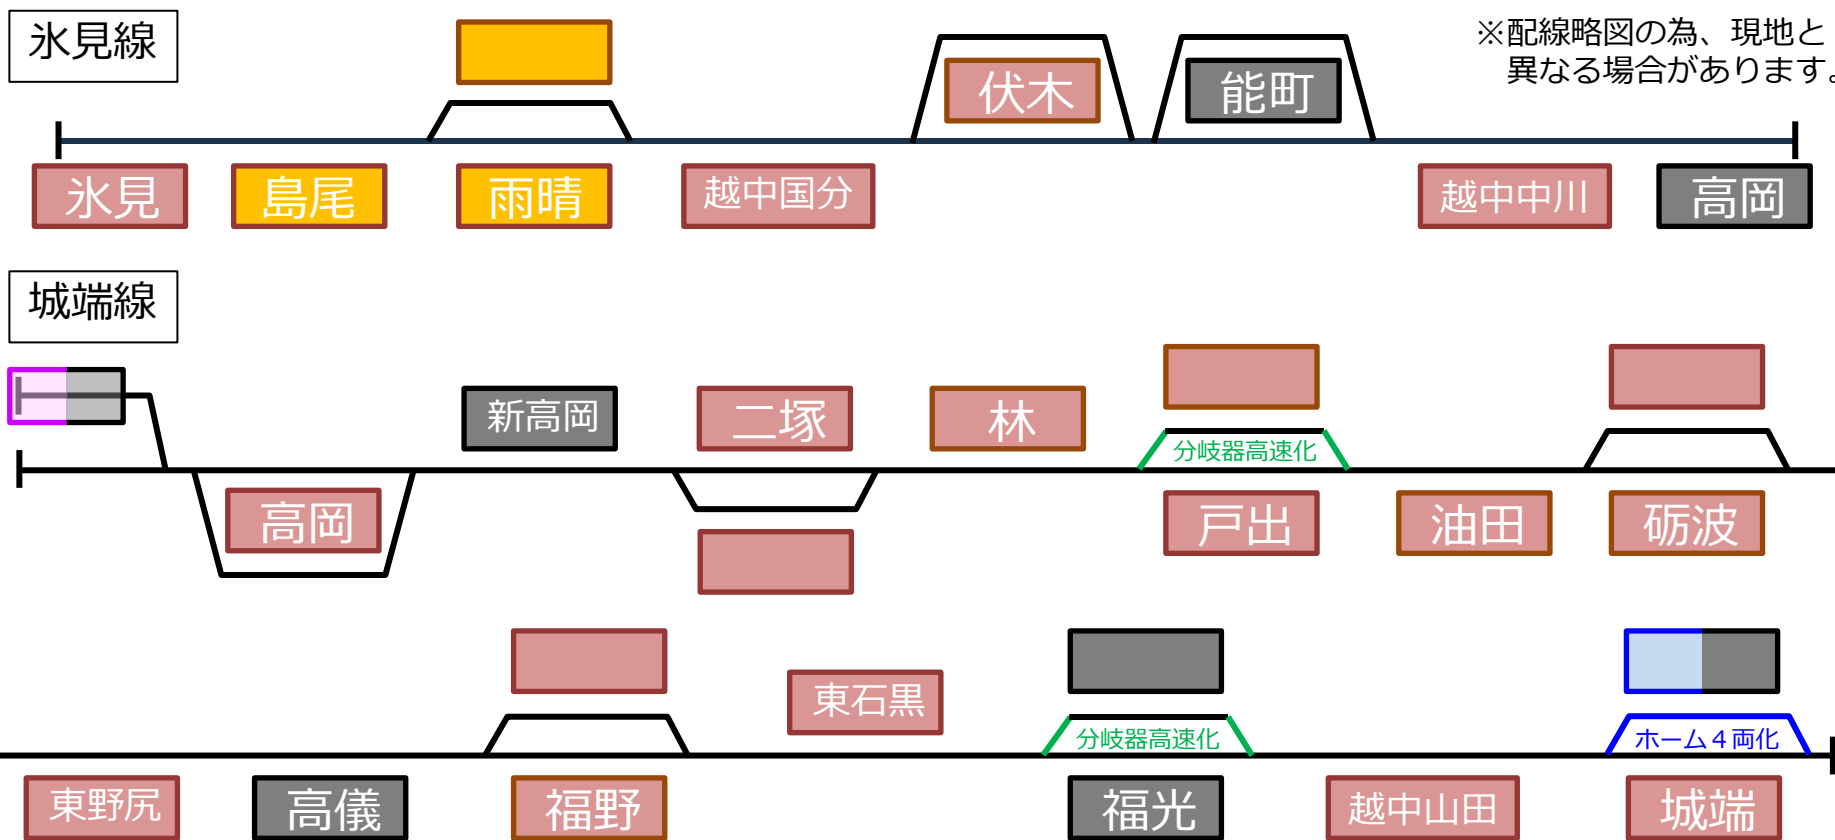

物価高騰や施工量の増加等により、移管前事業費を当初計画258.4億→292.2億へ見直し(+33.8億)
