


富山地方鉄道立山線沿線における斜面防災対策の概要（治山事業）

資料2-1：富山県

富山県農林水産部

全体計画							緑：完了 赤：実施中 黄色：計画			
		事業		R 7			R 8		R 9 ～R12	
				9月	12月	3月	4 月	10月		
対応と計画	県	公共	横江～千垣地区				測量・設計		溪間工事	
			本宮地区				測量・設計	溪間工事	測量・設計	山腹工事
		県単	全体	航空レーザ測量						
			横江～千垣地区							
			本宮地区				測量・設計	測量・設計		
		富山市・立山町				保安林指定同意取得				

現在の対策状況		緑：完了 赤：実施中
区域全体調査	航空レーザ計測一式：県単独治山事業（R7年9月補正）	
立山町 横江～千垣地区	荒廃溪流における治山ダム等の設置 ☐ 復旧治山事業（令和7年11月補正～令和11年度） R8事業：測量設計実施（R7補正） ☐ 県単独治山事業（立山町への補助1/2） R8事業：立山町千垣地内治山事業に係る地権者同意取得業務	
富山市 本宮地区	落石防止のための治山施設の設置、荒廃森林の整備 ☐ 予防治山事業（令和8年度～令和12年度） R8事業：測量設計・谷止工1基（R8当初） ☐ 県単独治山事業（県営） R8事業：測量設計実施（R7年2月補正、R8年9月補正） ◇市単独事業：富山地方鉄道立山沿線治山工事にかかる地権者同意取得交渉業務委託	

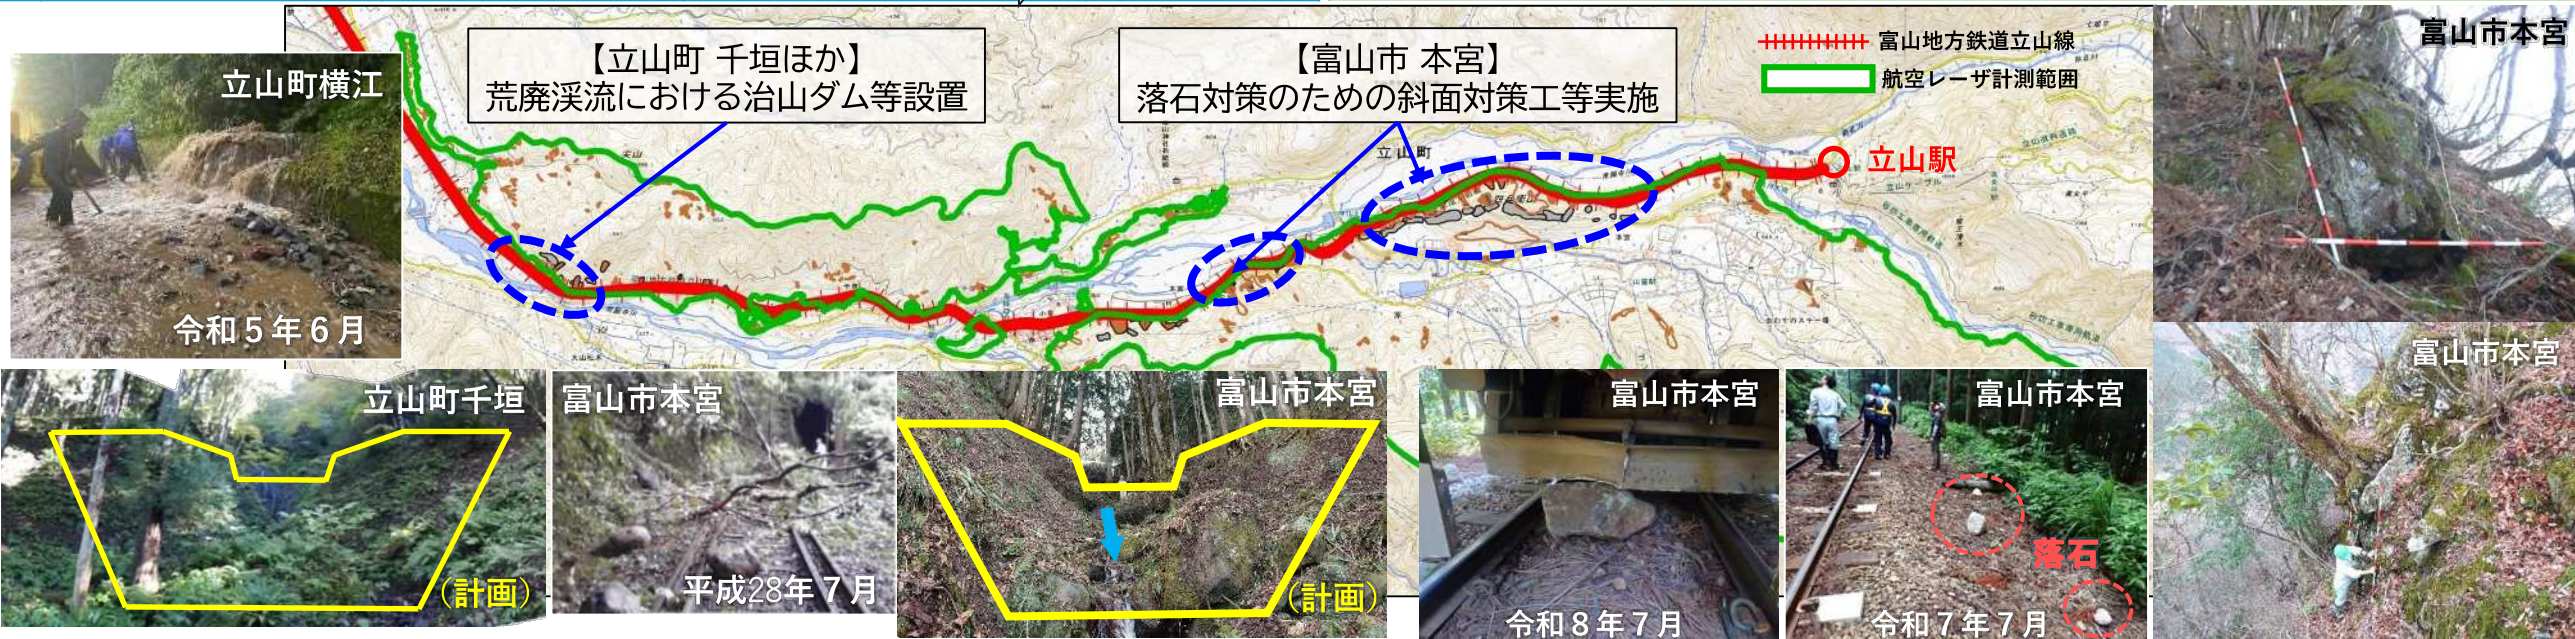

富山地方鉄道立山線沿線における斜面防災対策の概要（砂防事業）

資料2-2：富山県

【砂防メンテナンス事業（急傾斜）】千垣地区（補助率：国50/100）

事業箇所：立山町千垣地内（がけ高約78m、勾配約32°）

事業概要：斜面对策工

今後の予定：R 7まで 測量、地質調査、対策工法検討

R 8 詳細設計、用地測量

R 9以降 用地寄付、立木補償、工事実施



富山県土木部

