

## 最近のLPガス事故（富山県）

### 住宅団地のガス管損傷による漏えい（R06,07 県内）

\* 令和6年12月、**住宅団地の水道工事**に際し、他工事業者が重機で道路を掘削したところ、集団供給用の液化石油ガス埋設供給管が折損し、ガスが漏洩した。（漏えい量は40～50kg程度と推定）


\* 令和7年9月、**住宅団地の下水道工事**に際し、他工事業者が道路掘削前の事前工事を実施したところ、集団供給用の液化石油ガス埋設供給管が折損し、ガスが漏洩した。（漏えい量は60kg程度と推定）



**（原因）** 他工事業者と事前に打ち合わせを実施していたが、工事当日は立会が無かった。  
⇒ **（対策）** 工事業者と工事の都度連絡をとること、受託事業者など関係者全員へ情報共有することを徹底。

### 事業所内のガス管損傷による漏えい（R07 県内）

\* 令和7年12月、消費先事業所内の工場増築に伴う基礎部分の掘削工事に際し、他工事業者が重機で敷地内を掘削したところ、GHP燃料用の液化石油ガス埋設配管が折損し、ガスが漏洩した。（漏えい量は25kg程度と推定）

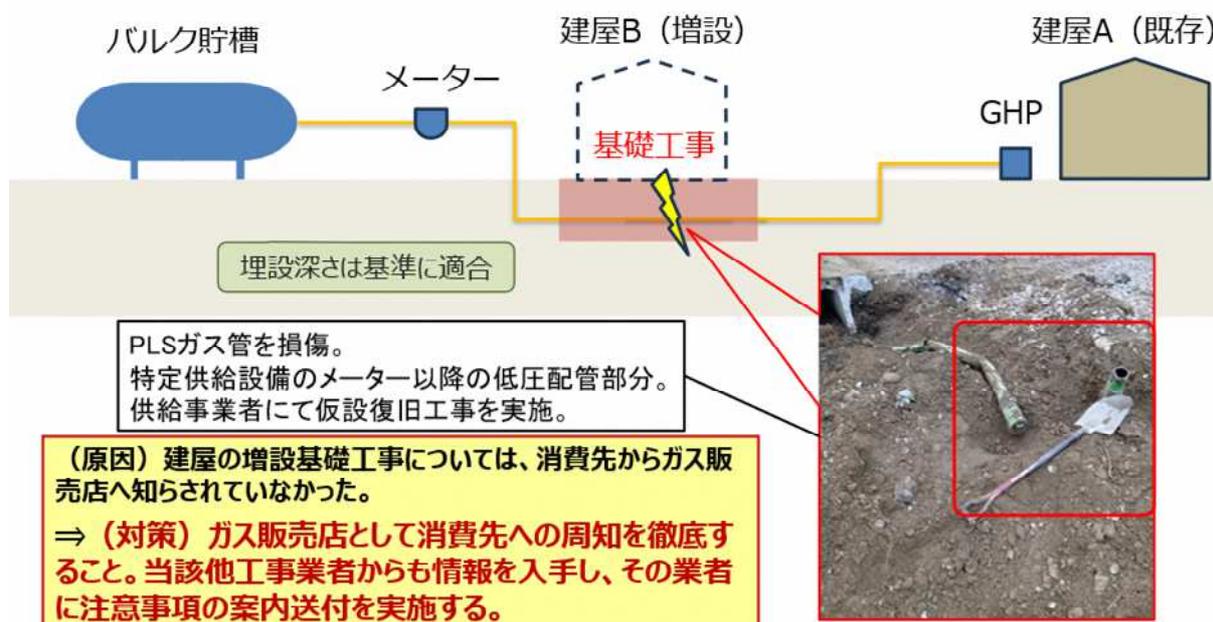

## 埋設ガス管の破損による漏えい酸欠（H27、県内）

下水道工事のため、埋設ガス管の表示付近を重機で掘削



埋設ガス管を破損し、ガスが漏えい



応急措置のため、掘削穴に入る



作業員1名が酸欠のため意識を失う  
救急搬送後、死亡



事故発生後の対応

- ① 設置済のガス表示杭を、社名及び連絡先等を明記してあるものに取り替え
- ② 土地の購入者や他工事業者に、ガス引込管があることを周知

LPガス販売事業者への事前確認等はなかった



破損した埋設ガス管  
(埋設深さは基準に適合)
