

氷見地区の減災に係る取組方針 (案)

令和 8 年 月 日

大規模氾濫に関する氷見地区減災対策協議会

目 次

1. はじめに	P. 1
2. 本協議会の構成員	P. 3
3. 氷見地区を流下する河川の主な特徴と災害発生状況等	P. 4
4. 減災のための目標	P. 7
5. 現状と課題	P. 8
6. 令和12年度までに実施する取組	P. 12
7. フォローアップ	P. 15

1. はじめに

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨では、流下能力を上回る洪水により鬼怒川の堤防が決壊し、氾濫流による家屋の倒壊・流失、広範囲かつ長期間の浸水が発生しました。これに住民避難の遅れも加わり、近年の水害では例を見ないほど多数の孤立者が発生するなど甚大な被害となりました。

こうした背景から、平成 27 年 12 月に社会資本整備審議会会長から国土交通大臣に対して「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～」が答申されたことを踏まえ、国土交通省では「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」との考えに立ち、「水防災意識社会 再構築ビジョン」を取りまとめました。

そのような中、平成 28 年 8 月の台風 10 号では岩手県小本川が氾濫し、小本川沿川の高齢者福祉施設で 9 名の死者が出る被害が発生するなど中小河川における甚大な被害発生を受け、県管理河川においても「水防災意識社会」の再構築に向けた取組をさらに加速させ、全国の河川において取組を推進していくことが必要との考えから、平成 28 年 10 月に国土交通省水管理・国土保全局長通知により、県管理河川についても、「水防災意識社会 再構築ビジョン」及び平成 29 年 6 月(平成 29 年 12 月修正)に公表された国土交通省『水防災意識社会』の再構築に向けた緊急行動計画」に基づく取組を推進していくこととなりました。

これらを踏まえ、富山県では河川管理者、市町村などの関係機関が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進することにより、氷見地区において氾濫が発生することを前提として社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的に「大規模氾濫に関する氷見地区減災対策協議会」(以下、「本協議会」という。)を平成 29 年 6 月 1 日に設立しました。

その後、令和元年東日本台風をはじめ、近年頻発している激甚な水害や気候変動による今後の降雨量の増大と水害の激甚化・頻発化に備えるため、国土交通省では令和 2 年 9 月に防災・減災が主流となる社会の実現に向けて「総力戦で挑む防災・減災プロジェクトの推進」が打ち出され、その流れを踏まえ、二級水系についても「流域治水プロジェクト協議会」が令和 2 年度から設立され、あらゆる関係者により流域全体で水害を軽減させる取り組みが推進されることになり、令和 3 年度より主に「ハード対策」に重点を置いた取組みが本格化しました。

このことから、本協議会では、避難計画・水防対策を重点した「ソフト対策」を推進することになりました。

本協議会では、「現状の水害リスク情報」や「市町村が行う円滑かつ迅速な避難の取組」、「的確な水防活動等の取組」など各取組状況の情報を共有し、円滑かつ迅速な避難や的確な水防活動等を実現するために地域の取組方針を作成し、共有することとします。また、水防法の改正に伴い法定協議会としてこれまで以上に効力が大きくなっています。

今後、本協議会の各構成員は、本取組方針に基づき連携して減災対策に取組み、毎年出水期前に本協議会を開催し、進捗状況を定期的に確認するなどフォローアップを行うこととします。

2. 本協議会の構成員

本協議会の参加機関及び構成員は以下のとおりである。

参加機関	構成員
氷見市	市長
高岡市 消防本部 氷見消防署	署長
富山県 高岡土木センター 氷見土木事務所	所長
富山県 高岡農林振興センター	所長
富山県 土木部 河川課	課長
富山県 土木部 砂防課	課長
富山地方気象台	台長
 <オブザーバー>	
北陸地方整備局 富山河川国道事務所	
西日本旅客鉄道株式会社 金沢支社	
北陸電力株式会社 高岡支店	

3. 氷見地区を流下する河川の特徴と災害発生状況等

(1) 河川の特徴

① 仏生寺川

仏生寺川は、その源を吉池地区大坂峠に発し、低湿地帯を貫流しながら富山湾に注ぐ二級河川である。河床勾配は上流部で1/200~1/500、下流部で1/1,000~1/3,000と極めてゆるく、林相は大部分が広葉樹である。

本川上流部は古くから十三谷と呼ばれ、降雨が支川から集中的に流れ込み、たび重なる洪水に見舞われてきた。また、下流部は、氷見の水濠と呼ばれ、典型的な低湿地帯となっている。

② 上庄川

上庄川は、石川県境の坪池・土倉に源を発し、途中、触坂地区で桑院川と合流して、さらに三尾川、論田川を合流し、上庄谷平地を貫流して富山湾に注ぐ氷見市最大の二級河川である。

河口付近は、氷見漁港もあることから、氷見市の中心地として栄えている。

③ 余川川

余川川は、石川県との県境、氷見市懸札地内の基石ヶ峰にその源を発し、途中一芻川等の支川と合流しながら山間部を流下後、氷見市高柳、稲積地内の田園地帯を東に流下し、氷見市間島町内で富山湾に注ぐ二級河川である。

余川川流域は、氷見市市街地に位置する間島地内を除き、その流域の大部分が山地、水田で占められる。

④ 阿尾川

阿尾川は石川県県境付近の荒山峠にその源を発する胡桃川及び国見川の2河川が、氷見市磯辺地内で合流して阿尾川を形成し、氷見市針の木地内の山間部を蛇行しながら流下し、途中森寺川、北八代川等の支川と合流しながら氷見市森寺、指崎地内の田園地帯を流下後、氷見市阿尾地内で富山湾に注ぐ、二級河川である。

阿尾川流域は、その大部分が急峻な山地で占められており、特に阿尾川形成前の胡桃川及び国見川上流域の荒廃状況は著しく、砂防堰堤が40基以上施工されている。

⑤ 宇波川

宇波川は石川県旧鹿島町の石動山(564m)の南斜面に源を発し、石川・富山県境を経て白川地内で五十谷川と合流後、氷見市宇波、脇方地内で富山湾に注ぐ、流域面積15.7km²、流路延長7.5kmの二級河川であり、その平均河床勾配はI=1/30と極めて急流な河川である。


沿川の土地利用状況としては主に耕地、山地が大部分を占めるが、河口より上流700mの間は、豪華な拝殿を持つ宇波神社を中心に住居が立ち並び、かつて氷見市北部の商業経済の中心地として栄えた名残を残している。

これらの河川の特徴を踏まえ、河川の特徴が概ね同じと見なせる河川を一つのグ

ループとして、グループ毎に取り組みを検討する。氷見地区におけるグループ分けは、以下のとおりとする。

グループ名	所属する河川		グループ選定理由
	水系名	河川名	
仏生寺川グループ	仏生寺川	仏生寺川	平野部を流下する河川
上庄川・阿尾川等グループ	上庄川	上庄川	谷地形を流下する河川
	余川川	余川川	
	阿尾川	阿尾川	
	宇波川	宇波川	

<参考> 県管理河川のグループ分割

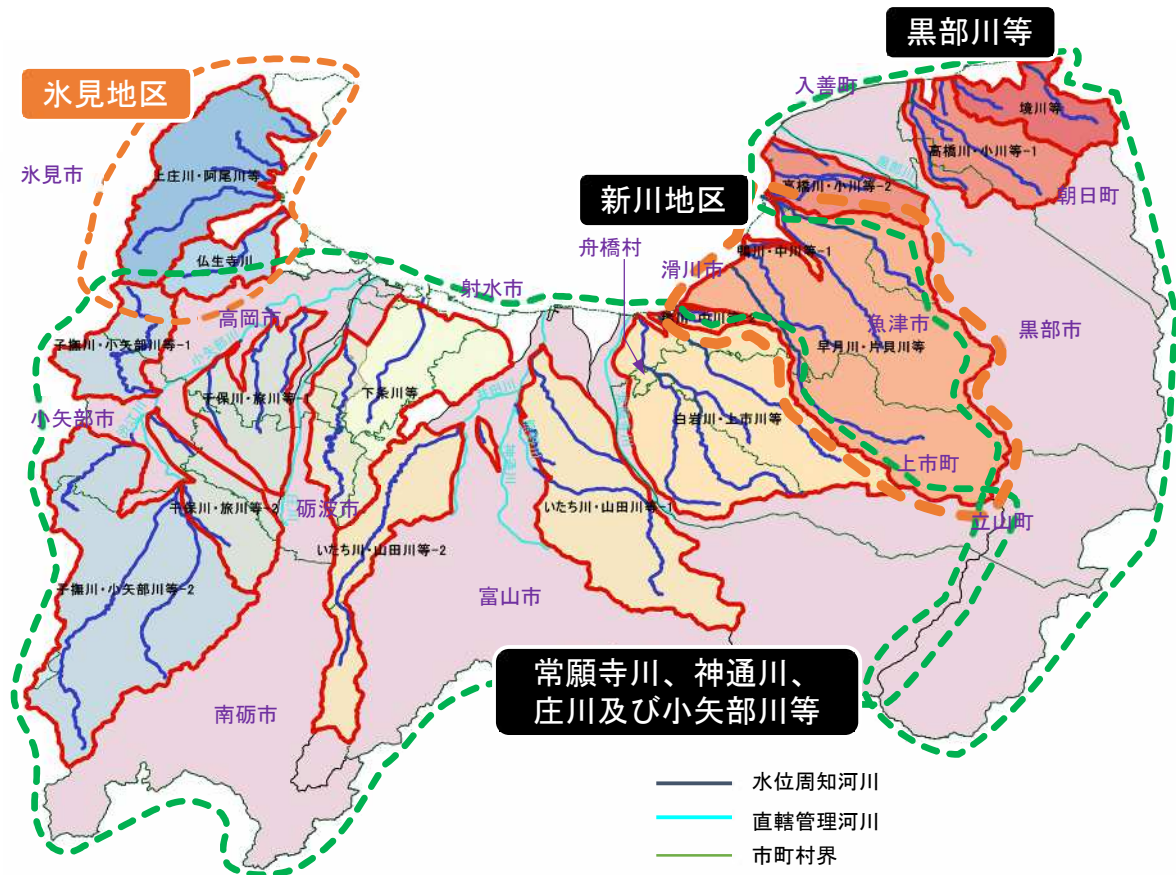

協議会	グループ名	水系名	河川名	主な着眼点
黒部川等	境川等グループ	境川	境川	急峻な谷地形を流下する河川
		笹川	笹川	
	高橋川・小川等グループ	木流川	木流川	
		小川	小川	
		舟川	舟川	
新川地区	早月川・片貝川等グループ	山合川	山合川	扇状地内を流下する河川
		吉田川	吉田川	
		高橋川	高橋川	
		黒瀬川	黒瀬川	
		片貝川	片貝川	
氷見地区	仏生寺川グループ	片貝川	片貝川	流域面積が比較的大きく、主に郊外を流下する築堤河川
		布施川	布施川	
	上庄川・阿尾川等グループ	早月川	早月川	
		魚川	魚川	
		魚川	魚川	

協議会	グループ名	水系名	河川名	主な着眼点
常願寺川神通川庄川小矢部川等	白岩川・上市川等グループ	上市川	上市川	神通川流域内を流下する河川
		白岩川	白岩川	
		白岩川	白岩川	
		白岩川	白岩川	
		白岩川	白岩川	
	いたち川・山田川等グループ	白岩川	白岩川	主に射水市内の平野部を流下する河川
		神通川	神通川	
		神通川	神通川	
		神通川	神通川	
		神通川	神通川	
下条川等グループ	神通川	神通川	小矢部川流域内で、主に農排水路を起点とし、比較的川幅が狭い河川	
	神通川	神通川		
	神通川	神通川		
	神通川	神通川		
	神通川	神通川		
千保川・旅川等グループ	下条川	下条川	小矢部川流域内で、山間地を起点とし、河川幅が比較的広い河川	
	庄川	庄川		
	小矢部川	小矢部川		
	小矢部川	小矢部川		
	小矢部川	小矢部川		

(2) 近年の災害発生状況と河川改修の状況

① 近年の災害発生状況

氷見地区においては、以下に挙げる浸水被害が過去に発生している。

河川名	発生日月	発生要因	被害状況等
仏生寺川	平成 14 年 7 月	台風 7 号	浸水面積 1.3ha、床下浸水 12 戸
上庄川	平成 17 年 7 月	豪雨	床下浸水 19 戸、農地浸水 63.9ha
仏生寺川他	平成 24 年 7 月 20 日 ～7 月 21 日	豪雨（時間雨量 80mm：高岡市福岡町 五位）	県西部（高岡、氷見、射水市）を中心 に公共土木施設災害は 22 箇所、 被害額約 1 億 5 千万円、建物被害は 全壊 2 棟、床上浸水 255 棟、床下浸 水 395 棟に達するなど甚大な災害と なった。 【仏生寺川】浸水面積 1.0ha、床下 浸水 10 戸



平成 14 年 7 月 仏生寺川



平成 17 年 7 月 上庄川

② 河川改修の状況（参考事例）

二級河川上庄川水系上庄川では、平成 17 年 7 月梅雨前線豪雨、平成 25 年 8 月豪雨での浸水被害をはじめとして、過去には降雨により幾度も氾濫し、甚大な被害が発生している。これに対し、平成 28 年度から河床掘削、築堤等の整備を実施し、浸水被害の解消が図られてきている。

二級河川仏生寺川水系仏生寺川は、川幅が狭く蛇行していることから、昭和 44 年の豪雨や平成 10 年の台風での浸水被害をはじめとして、幾度も氾濫し、甚大な被害が発生している。これに対し、昭和 43 年度から河床掘削、築堤等の整備を実施し、浸水被害の解消が図られてきている。

4. 減災のための目標

氷見地区において、各構成員が連携して達成すべき減災のための目標は、以下のとおりとした。

【仏生寺川グループ】

■令和12年度までに達成すべき目標

氾濫域に低湿地があり、氷見市の市街地が形成されている地形特性等を踏まえ、仏生寺川での大規模水害に対し、『川や集落・低湿地帯を流れる洪水の理解』『迅速かつ確実な避難』を目標とする。

※大規模水害・・・想定し得る最大規模降雨に伴う洪水氾濫による被害。

※川を流れる洪水・・・急に水位が上がる。流速が早く堤防・河岸が削られる。

※集落・低湿地帯を流れる洪水・・・一旦破堤すると勢いのある水が短時間で集落・低湿地帯に広がる。

※迅速かつ確実な避難・・・水深が浅くても歩行できない状況の前に安全な場所への避難。

■上記目標達成に向けた3本柱の取組

上記目標の達成に向け、仏生寺川において、河川管理者が実施する堤防整備等の洪水を安全に流す対策に加え、以下の取り組みを実施する。

- ① 仏生寺川特有の洪水現象について理解を頂くための周知・理解促進の取り組み
- ② 仏生寺川の特性を踏まえた大規模水害における避難行動の取り組み
- ③ 安全に避難行動をとるための情報提供の取り組み

【上庄川・阿尾川等グループ】

■令和12年度までに達成すべき目標

氾濫流の流れが速く、氷見市の集落を流下する氾濫形態となる急流河川特有の地形特性等を踏まえ、上庄川・阿尾川等での大規模水害に対し、『川や集落を流れる洪水の理解』『迅速かつ確実な避難』を目標とする。

※大規模水害・・・想定し得る最大規模降雨に伴う洪水氾濫による被害。

※川を流れる洪水・・・急に水位が上がる。流速が早く堤防・河岸が削られる。

※集落を流れる洪水・・・一旦氾濫すると勢いのある水が短時間で集落を流下する。

※迅速かつ確実な避難・・・水深が浅くても歩行できない状況の前に安全な場所への避難。

■上記目標達成に向けた3本柱の取組

上記目標の達成に向け、上庄川・阿尾川等において、河川管理者が実施する堤防整備等の洪水を安全に流す対策に加え、以下の取り組みを実施する。

- ① 急流河川特有の洪水現象について理解を頂くための周知・理解促進の取り組み
- ② 上庄川・阿尾川等の特性を踏まえた大規模水害における避難行動の取り組み
- ③ 安全に避難行動をとるための情報提供の取り組み

なお、ハード対策は流域治水プロジェクト協議会へ移行されたが、本協議会においても関連深い取組が多いことから、引き続き主な取組として整理する。

5. 現状と課題

県管理河川における減災対策に関する現状と課題は以下のとおりである。

① 地域住民の河川特有の洪水の理解に関する事項

項目（○：現状、●：課題）	
河川特有の洪水の理解	○管理区間における氾濫流による浸水被害の状況、近年の氾濫被害の状況の整理。
	ア ●治水事業の進展等による被害発生頻度の減少により、地域住民の防災意識が低い状況である。
	イ ●過去に洪水や氾濫被害を経験している人が少なくなっている。

② 情報伝達、避難計画等に関する事項

項目（○：現状、●：課題）	
洪水時における河川管理者からの情報提供等の内容及びタイミング	○想定最大規模及び河川整備基本方針に基づく計画規模の外力による洪水浸水想定区域図の公表。
	○避難指示等の発令判断の目安となる氾濫危険情報の発表等の洪水予報の実施（管理者と気象台の共同）。
	○災害発生のおそれがある場合における、土木センター・事務所長から沿川自治体の首長への情報伝達（ホットライン）の実施。
	ウ ●浸水想定区域図等が洪水に対するリスクとして認識されていないことが懸念される。 ●中小河川における水害危険性の周知促進が求められる。
	エ ●水位予測の精度の問題や長時間先の予測情報不足から、水防活動の判断や住民の避難行動の参考となりにくい。
避難指示等の発令基準	○地域防災計画に具体的な避難指示等の発令基準や対象地域を明記している。（国のガイドライン（案）に基づく見直し済）
	オ ●県管理河川における避難指示等の発令に着目したタイムライン（防災行動計画）の作成を進める必要がある。 ●警戒避難体制の強化が求められる。
避難場所・避難経路	○避難場所として、公共施設を指定し、 想定最大規模 の洪水に対する水害ハザードマップ等で周知している。
	カ ●大規模氾濫による避難者数の増加や避難場所、避難経路において浸水や土砂災害が発生する場合には、住民の避難が適切に行えないことが懸念される。
	キ ●大規模氾濫による避難場所周辺の浸水継続時間が長期に渡る場合には、住民等が長期にわたり孤立することが懸念される。
	ク ●避難に関する情報は水害ハザードマップ等で周知しているが、住民等に十分に認知されていないおそれがある。

③ 情報伝達、避難計画等に関する事項（続き）

項目（○：現状、●：課題）		
住民等への 情報伝達の 体制や方法		○防災行政無線によるサイレン吹鳴及び避難指示等の放送、災害情報や緊急速報のメール配信、SNS、緊急告知FMラジオ、広報車による周知、報道機関への情報提供等を実施している。
		○河川管理者等からWEB等を通じた河川水位やダム貯水位、ライブ映像情報などを住民等に情報提供している。
		○平成28年8月に富山県総合防災システムを更新し、Lアラート等を活用して報道機関と連携した住民等への情報提供（災害対策本部設置、避難勧告、被害情報等）を開始した。
	ケ	●大雨・暴風により防災行政無線が聞き取りにくい状況や浸水による停電により情報発信できない恐れがある。
	コ	●WEB等により各種情報を提供しているが、住民自らが情報を入手するまでに至っていない懸念がある。
	サ	●災害時に国・県・市においてWEBやメール配信による情報発信を行っているが、一部の利用にとどまっているため、広く周知・啓発を行い、利用者の拡大が求められている。 また、大規模工場等が被害を受けた場合、社会的影響が大きい懸念がある。
	ミ	●水害・土砂災害関連の記者発表内容や情報共有サイト等について、内容や用語の分かりやすさに懸念がある。
	ム	●住民の避難行動のためのトリガーとなる情報が明確になっていない懸念がある。
避難誘導體制		○避難誘導は、警察、消防機関、自主防災組織、水防団員（消防団員）と協力して実施している。
	ス	●災害時の具体的な避難支援や避難誘導體制が確立されていないため、特に要配慮者等の迅速な避難が確保できないおそれがある。

④ 水防に関する事項

項目（○：現状、●：課題）		
河川水位等 に係る情報 提供		○基準観測所の水位により水防警報を発表している。
		○水防警報を水防団員へFAX等により情報提供している。
		○災害発生のおそれがある場合は、河川管理者及びダム管理者から沿川自治体の首長に情報伝達（ホットライン）をしている。
	セ	●急流河川では、洪水毎に濡筋が変化し、洪水の流れが複雑であることから、適切に水防活動を実施すべき箇所を特定し、共有することが必要である。
	ソ	●現況堤防が旧河道上に築堤されている箇所が多いことから、適切に水防活動を実施すべき箇所を特定し、共有することが必要である。
	タ	●急流河川の特性や水防活動に時間を要する現地の特性等も踏まえた、迅速かつ適切な水防活動に懸念がある。

③ 水防に関する事項（続き）

項目（○：現状、●：課題）		
河川の巡視 区間		○出水期前に、自治体、水防団等と重要水防箇所の合同巡視を実施している。
		○出水時には、水防団等と河川管理者がそれぞれ河川巡視を実施している。
		○地域防災計画により、浸水被害が予想される箇所を巡回し、現状把握に努めている。
	チ	●河川巡視等で得られた情報について、水防団等と河川管理者で共有が不十分であり、適切な水防活動に懸念がある。
	ツ	●水防団員が減少・高齢化等している中でそれぞれの受け持ち区間全てを回りきれないことや、定時巡回ができない状況にある。
	テ	●水防活動を担う水防団員（消防団員）は、水防活動に関する専門的な知見等を習得する機会が少なく、的確な水防活動ができないことが懸念される。
水防資機材 の整備状況		○事務所、出張所、防災ステーション、水防拠点、緊急資材倉庫等に水防資機材を備蓄している。
	ト	●水防資機材の不足、劣化状況の確認、各機関の備蓄情報の共有等が不十分であり、適切な水防活動に懸念がある。
	ナ	●水防団員の高齢化や人数の減少により従来の水防工法では迅速に実施できるか懸念がある。
	ニ	●堤防決壊時の資機材について、配備箇所の見直しを含めた再確認が必要である。
市・町庁 舎、企業、 病院等の水 害時における 対応		○防災拠点となる市・町庁舎は洪水浸水想定区域外、または非常用発電機室、コンピュータサーバなどが上階に設置され防災拠点機能を確保している。
	ヌ	●地域の企業を巻き込んだ水防支援体制が整っておらず、効果的な自主水防活動を行えていない。

⑤ 氾濫水の排水、施設運用等に関する事項

項目（○：現状、●：課題）		
排水施設、 排水資機材 の操作・運 用		○排水ポンプ車や照明車等の災害対策車両・機器において平常時から定期的な保守点検を行う。
		○機械を扱う職員等への訓練・教育も実施し、災害発生による出動体制を確保している。
		○樋門・陸閘の操作点検を出水期前に実施している。
		○雨水ポンプ場等による排水活動及びポンプ委託による内水排除対策を実施している。
	ネ	●排水すべき水のボリュームが大きく、現状の施設配置計画では、今後想定される大規模浸水に対する社会経済機能の早期回復に向けた対応を行えない懸念がある。
	ノ	●社会経済機能の早期回復のために有効な排水計画の策定及び必要な更新に取り組む必要がある。

④ 氾濫水の排水、施設運用等に関する事項（続き）

項目（○：現状、●：課題）		
関係機関と連携した施設運用		○豪雨時に農業用排水路等から一部浸水する場所がある。
		○水田・学校校庭の有効利用が謳われている。
	ハ	●豪雨時の支線の排水処理を適切に実施する必要がある。
	ヒ	●水田・校庭の貯留効果を見込む対策を実施する必要がある。

⑥ 河川管理施設の整備に関する事項

項目（○：現状、●：課題）		
既存ダムにおける洪水調節の現状		○洪水調節機能を有するダムなどで、洪水を貯留することにより、下流域の被害を軽減させている。
堤防等河川管理施設の現状の整備状況及び今後の整備内容		○急流河川対策として、河川の洗掘や侵食に対する安全度や背後地の状況等を踏まえ、護岸等の整備を推進している。
		○計画断面に満たない堤防や流下能力が不足する箇所に対し、河道掘削を推進している。
		○堤防の漏水など越水以外にも洪水に対するリスクが高い箇所について、整備を推進している。
	フ	●計画断面に対して高さや幅が不足している堤防や流下能力が不足している箇所があり、洪水により氾濫するおそれがある。
	ヘ	●堤防の漏水や侵食・洗掘など越水以外にも洪水や土砂・洪水氾濫に対するリスクが高い箇所が存在している。
	ホ	●今後、気候変動により、施設能力を上回る洪水の発生頻度が高まることが予想されるなかで、被害の軽減を図る必要がある。
マ	●洪水に対するリスクが高いにも関わらず、住民避難の時間確保ができないおそれがある。	

6. 令和12年度までに実施する取組

各構成員が取り組む主な内容は次のとおりであり、実施する機関毎の実施内容・時期を「仏生寺川グループ」及び「上庄川・阿尾川等グループ」でそれぞれ整理する。

(1) ハード対策の主な取組

各機関が実施するハード対策のうち、主な取組項目は、以下のとおりである。

主な取組項目		課題の対応
I ①洪水を河川内で安全に流す対策 ②危機管理型ハード対策		
1	浸透対策、パイピング対策、流下能力対策、侵食・洗掘対策、堤防整備、霞堤の維持・保全、縦工の整備、漏水対策、河道管理、ダムによる洪水調節、洪水をバイパス等で排水する施設の整備、河道浚渫・河道掘削、本川・支川合流部対策、土砂・洪水氾濫対策（①）	フ
2	堤防天端の保護、裏法尻の補強（②）	へ、ホ
II 避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備		
3	新技術を活用した水防資機材の検討及び配備	タ、チ
4	洪水時の状況を把握し、円滑な避難活動や水防活動を支援するため、雨量計、水位計（簡易水位計を含む）、河川監視カメラや量水標等の基盤の整備	コ、サ、シ
5	防災行政無線や防災ラジオ等のデジタル化による改良	コ、サ、シ
6	浸水時においても災害対応を継続するための施設の整備及び非常用発電装置等の耐水化	ト、ニ、ノ
7	浸透ますの設置、校庭貯留の実施	ヒ
8	各戸貯留・浸透施設の設置に対する支援制度の確立、水田貯留に対する支援制度の確立	ヒ
9	農業用排水路に設置されている水門管理の徹底	ハ
10	応急的な退避場所の確保	カ
11	ダム等の洪水調節機能の向上・確保	へ、ホ
12	重要インフラの機能確保	カ
13	樋門等の施設の確実な運用体制の確保	ホ
14	河川管理の高度化	フ、へ、ホ

(2) ソフト対策の主な取組

各機関が実施するソフト対策のうち、主な取組項目は、以下のとおりである。

① 河川特有の洪水を理解するための周知・理解促進の取組

主な取組項目		課題の対応
Ⅲ 平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組		
15	水害の歴史、洪水特性の周知理解促進のための副教材の作成・配布	ア, イ
16	小中学校等における水災害・土砂災害教育を実施	ア, イ
17	出前講座等を活用し、水防災等に関する説明会を開催	ア, イ
18	効果的な「水防災意識社会」の再構築に役立つ広報や資料を作成・配布	キ
19	自治会や地域住民が参加した洪水に対するリスクの高い箇所の共同点検の実施	ア, イ
20	「災害・避難カード」を用いた平時からの住民等への周知・教育・訓練	ア, イ
21	災害リスクの現地表示	エ, オ, カ, ク
22	避難訓練への地域住民の参加促進	ス
23	住民の防災意識を高め、地域の防災力の向上を図るための自主防災組織の充実及び地域包括支援センター・ケアマネージャーとの連携	サ
24	住民一人一人の避難計画・情報マップやマイタイムラインの作成促進	ス
25	水災害の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	コ, サ, シ, ス

② 迅速かつ確実な避難行動のための取組

主な取組項目		課題の対応
Ⅳ 情報伝達、避難計画等に関する取組		
26	想定最大規模降雨による浸水想定区域図、浸水継続時間、家屋倒壊等氾濫想定区域等の作成・公表と適切な土地利用の促進	ア, イ, ウ
27	新たな洪水ハザードマップの策定（広域的な避難計画等も反映）	カ, キ, ク
28	新たなハザードマップの各戸配布・周知（ハザードマップポータルサイトや地図情報等の活用など）	カ, キ, ク
29	リアルタイムの情報提供やプッシュ型情報の発信など防災情報の充実（水位や河川状況等ライブカメラ情報、避難情報） 危険レベルの統一化等による災害情報の充実	ケ, コ, サ, シ
30	避難指示等の発令に着目した防災行動計画（タイムライン）の整備及び検証と改善	オ, マ
31	中小河川及びダムにおいて、相当な被害が発生する可能性を予見した場合、首長等への直接の情報提供（ホットライン）の実施	ウ, エ
32	要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進	ス
33	立ち退き避難が必要な区域及び避難方法の検討	カ, キ, ク
34	参加市町村による広域避難計画の策定及び支援	カ, キ, ク
35	広域的な避難計画等を反映した新たな洪水ハザードマップの策定・周知	カ, キ, ク
36	水位予測の検討及び精度の向上 小規模の流域・急流河川に対応する精度の高い降雨・洪水予測の実施	エ

③ 迅速かつ確実な避難行動のための取組（続き）

主な取組項目		課題の対応
IV 情報伝達、避難計画等に関する取組		
37	気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善	シ
38	水位周知河川等に指定されていない河川における水害危険性の周知促進や浸水実績等の周知	ウ
39	防災施設の機能に関する情報提供の充実	ミ, ム
40	ダム放流情報を活用した避難体系の確立	ミ, ム
41	災害拠点病院等の施設管理者への情報伝達の充実	ミ, ム

④ 洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組

主な取組項目		課題の対応
V 水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組		
42	水防団等への連絡体制の確認と首長も参加した実践的な情報伝達訓練の実施	カ, キ, ク, チ
43	自治体関係機関や水防団が参加した洪水に対するリスクの高い箇所での合同巡視の実施	セ, ソ, タ, チ
44	関係機関が連携した水防実働訓練等を実施	テ, ト, ナ
45	水防活動の担い手となる水防団員・水防協力団体の募集・指定を促進	ツ, ト, ナ
46	国・県・自治体職員等を対象に、水防技術講習会を実施	テ
47	大規模災害時の復旧活動の拠点等配置計画の検討を実施	ニ
VI ①要配慮者利用施設や大規模工場等（危険物施設を含む）の自衛水防の推進に関する取組 ②救援・救助活動の効率化に関する取組 ③排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施		
48	地域の事業者による水防支援体制の検討・構築（①）	又
49	要配慮者利用施設による避難確保計画の作成及び避難訓練の実施に向けた支援を実施（①）	ス
50	大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動（①）	サ
51	大規模工場における情報連絡体制の確立及び自衛水防活動の取組（①）	又
52	大規模災害時の救援・救助活動等支援のための拠点等配置計画の検討を実施（②）	カ, ネ
53	氾濫水を迅速に排水するため、排水施設の情報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水害を想定した排水計画（案）を検討・作成（③）	ネ, ノ
54	地下街が浸水した場合の排水計画（案）の検討を実施（③）	ノ
55	排水ポンプ車の出動要請の連絡体制等を整備（③）	ノ
56	排水計画（案）に基づき、関係機関が連携した排水実働訓練の実施（③）	ネ, ノ, ホ

7. フォローアップ

各機関の取組内容については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災計画、河川整備計画等に反映することなどによって責任を明確にし、組織的、計画的、継続的に取り組むことが重要である。

原則、本協議会を毎年出水期前に開催し、取組の進捗状況を確認し、必要に応じて取組方針を見直すこととする。また、実施した取組についても訓練等を通じて習熟、改善を図るなど、継続的なフォローアップを行うこととする。

また、今後、他の協議会の取組方針の内容や技術開発の動向等を収集した上で、随時、取組方針を見直すこととする。

様式ー1 R12まで実施する取組

具体的な事項の柱		取組計画及び取組内容			
項目	カテゴリ	該当グループ	富山県	富山地方気象台	氷見市
			仏生寺川 上庄川・阿尾川等	仏生寺川 上庄川・阿尾川等	仏生寺川 上庄川・阿尾川等
ハード対策の主な取組					
I ①洪水を河川内で安全に流す対策 ②危機管理型ハード対策					
1~2	1 浸透対策、パイピング対策、流下能力対策、侵食・洗掘対策、堤防整備、霞堤の維持・保全、縦工の整備、漏水対策、河道管理、ダムによる洪水調節、洪水をパイパス等で排水する施設の整備、河道浚渫・河道掘削、本川・支川合流部対策、土砂・洪水氾濫対策(①) 2 堤防天端の保護、裏法尻の補強(②)	R12までの目標・計画	・洪水を河川内で安全に流すためのハード対策 ・河道内堆積土砂や樹木の計画的な撤去		計画的且つ継続的に護岸整備及び河道掘削などを行っていく
		R8年度実施内容			
3~14	II 避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 3 新技術を活用した水防資機材の検討及び配備 4 洪水時の状況を把握し、円滑な避難活動や水防活動を支援するため、雨量計、水位計(簡易水位計を含む)、河川監視カメラや量水標等の基盤の整備 5 防災行政無線や防災ラジオ等のデジタル化による改良 6 浸水時においても災害対応を継続するための施設の整備及び非常用発電装置等の耐水化 7 浸透ますの設置、校庭貯留の実施 8 各戸貯留・浸透施設の設置に対する支援制度の確立、水田貯留に対する支援制度の確立 9 農業用排水路に設置されている水門管理の徹底 10 応急的な退避場所の確保 11 ダム等の洪水調節機能の向上・確保 12 重要インフラの機能確保 13 避難所の施設整備の確立や運用体制の確保	R12までの目標・計画	・危機管理型水位計の適切な維持管理 ・危機管理型水位計の耐水化や改良等		・R9年度・10年度、防災行政無線更改工事 これまでのMCA方式に替わる新方式による防災行政無線を整備。併せて、市民の手元に情報を届ける手段として、個別受信機(防災ラジオ等)の配備や防災アプリについて検討する。 ※R8年度、実施設計予定。
		R8年度実施内容			
ソフト対策の主な取組					
①河川特有の洪水を理解するための周知・理解促進の取組					
15~25	III 平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組 15 水害の歴史、洪水特性の周知理解促進のための副教材の作成・配布 16 小中学校等における水災害・土砂災害教育の実施 17 出前講座等を活用し、水防災等に関する説明会を開催 18 効果的な「水防災意識社会」の再構築に役立つ広報や資料を作成・配布 19 自治会や地域住民が参加した洪水に対するリスクの高い箇所の共同点検の実施 20 「災害・避難カード」を用いた平時からの住民等への周知・教育・訓練 21 災害リスクの現地表示 22 避難訓練への地域住民の参加促進 23 住民の防災意識を高め、地域の防災力の向上を図るための自主防災組織の充実及び地域包括支援センター・ケアマネジャーとの連携 24 住民一人一人の避難計画・情報マップやマイタイムラインの作成促進 25 水災害の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	R12までの目標・計画	・小中学校等での出前授業の実施 ・県総合防災訓練の実施 ・県民を対象とした防災研修会・講習会の開催	・出前講座等の実施 ・広報活動「気象台へ行こう2026」の実施 ・防災気象講演会の開催(富山県と共催) ・防災担当者向け気象防災ワークショップの開催	・出前講座等を活用した啓発を積極的に実施 ・市総合防災訓練の実施 ・自主防災訓練の実施による避難路や危険箇所の検証 ・市民を対象とした防災講習会の開催 ・防災士の育成と自主防災会の中の防災士による講習会支援により、自助・共助による避難の普及啓発
		R8年度実施内容			
②迅速かつ確実な避難行動のための取組					
26~41	IV 情報伝達、避難計画等に関する取組 26 想定最大規模降雨による浸水想定区域図、浸水継続時間、家屋倒壊等氾濫想定区域等の作成・公表と適切な土地利用の促進 27 新たな洪水ハザードマップの策定(広域的な避難計画等も反映) 28 新たなハザードマップの各戸配布・周知(ハザードマップポータルサイトや地図情報等の活用など) 29 リアルタイムの情報提供やプッシュ型情報の発信など防災情報の充実(水位や河川状況等ライブカメラ情報、避難情報)、危険レベルの統一化等による災害情報の充実 30 避難指示等の発令に着目した防災行動計画(タイムライン)の整備及び検証と改善 31 中小河川及びダムにおいて、相当な被害が発生する可能性を予見した場合、首長等への直接の情報提供(ホットライン)及び報道機関への情報提供(Lアラート)の実施 32 要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 33 立ち退き避難が必要な区域及び避難方法の検討 34 参加市町村による広域避難計画の策定及び支援 35 広域的な避難計画等を反映した新たな洪水ハザードマップの策定・周知 36 水位予測の検討及び精度の向上 小規模の流域・急流河川に対応する精度の高い降雨・洪水予測の実施 37 気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警戒級の現象」等の改善 38 水位周知河川等に指定されていない河川における水害危険性の周知促進や浸水実績等の周知 39 防災施設の機能に関する情報提供の充実 40 ダム放流情報を活用した避難体系の確立	R12までの目標・計画	・県HP「富山県河川海岸カメラ・水位情報」による水位情報等のリアルタイム提供<継> ・河川の水位やダムの貯水水位が基準値を超えた場合にメールを配信するサービス「とやま河川メール」の運用<継> ・県と市町村間ホットラインの運用<継> ・土砂災害警戒区域の指定及び公表(随時) ・メディア説明会に参加 ・洪水浸水想定区域図の県HP掲載<継> ・浸水ナビHPへの掲載<継>	・警戒レベル4相当情報を含む新しい防災気象情報の運用開始(令和8年度5月下旬予定) ・洪水・浸水キキクルの改善(新情報に対応した表示変更や入力データへの速報版解析雨量の導入など) ・線状降水帯発生の可能性が高まっていることを発生2~3時間前を目処にお知らせする「線状降水帯直前予測」の運用開始(令和8年5月下旬予定) ・レベル4情報対象河川(外水)・対象格子(内水)の定期的見直しなどを含む気象情報運用に関する調整作業や気象情報の改定	・洪水対応演習の実施(氷見市総合防災訓練時に実施(継続)) ・中小河川の新たな洪水ハザードマップ(仏生寺川水系湊川他)の更新作成業務の実施、全戸配布(周知)(R7→R8線) ・避難行動要支援者リストを持つ自主防災会を中心に、要配慮者を想定した避難訓練を実施する。
		R8年度実施内容			
③洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組					
42~47	V 水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組 42 水防団等への連絡体制の確認と首長も参加した実践的な情報伝達訓練の実施 43 自治体関係機関や水防団が参加した洪水に対するリスクの高い箇所の合同巡視の実施 44 関係機関が連携した水防実働訓練等を実施 45 水防活動の担い手となる水防団員・水防協力団体の募集・指定を促進 46 国・県・自治体職員等を対象に、水防技術講習会を実施 47 大規模災害時の復旧活動の拠点等配置計画の検討を実施	R12までの目標・計画	・洪水対応演習に参加<毎> ・合同河川パトロール等の実施<毎>	・河川事務所主催の合同河川巡視等への参加 ・自治体などが主催する防災訓練等への参加	・河川管理者(県)と合同河川巡視を実施(継続)
		R8年度実施内容			

様式ー1 R12まで実施する取組

具体的な事項の柱		取組計画及び取組内容			
項目	カテゴリ	該当グループ	富山県	富山地方気象台	氷見市
			仏生寺川 上庄川・阿尾川等	仏生寺川 上庄川・阿尾川等	仏生寺川 上庄川・阿尾川等
VI	①要配慮者利用施設や大規模工場等（危険物施設を含む）の自衛水防の推進に関する取組 ②救援・救助活動の効率化に関する取組 ③排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施				
48～56	48 地域の事業者による水防支援体制の検討・構築（①） 49 要配慮者利用施設による避難確保計画の作成及び避難訓練の実施に向けた支援を実施（①） 50 大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動（①） 51 大規模工場における情報連絡体制の確立及び自衛水防活動の取組（①） 52 大規模災害時の救援・救助活動等支援のための拠点等配置計画の検討を実施（②） 53 氾濫水を迅速に排水するため、排水施設の情報共有、排水手法等の検討を行い、大規模水害を想定した排水計画（案）を検討・作成（③） 54 地下街が浸水した場合の排水計画（案）の検討を実施（③） 55 排水ポンプ車の出動要請の連絡体制等を整備（③） 56 排水計画（案）に基づき、関係機関が連携した排水実働訓練の実施（③）	R12までの 目標・計画	・要配慮者利用施設の避難計画の作成および訓練実施の促進への支援。	・避難計画への助言	・要配慮者利用施設による訓練実施報告の受理と、検証を継続実施する。
		R8年度 実施内容			
